

BEWONERSBULLETIN NIEUWBOUW

EENHEIDSBUREAU POLITIE DEN HAAG #2

Geachte omwonenden en overige geïnteresseerden,

Hierbij ontvangt u het tweede informatiebulletin van het project “Nieuwbouw Eenheidsbureau Den Haag”, kortweg EBDH. In de Binckhorst aan de Supernovaweg wordt een nieuw eenheidsbureau voor de politie gebouwd. Het nieuwe eenheidsbureau wordt een open gebouw en huisvest straks 2200 politiemedewerkers op zeven verdiepingen. De medewerkers zijn afkomstig van afdelingen die nu nog verspreid zijn over meerdere locaties in de regio in Den Haag.

We staan momenteel aan de vooravond van de eerste echt zichtbare werkzaamheden en daar willen wij u graag van op de hoogte stellen.

Vorbereiding

In mei is de aannemer (BAM Bouw en Techniek) gestart met het inrichten van het bouwterrein. Het bouwterrein is rondom in de hekken gezet. Op dit moment is nog niet het hele bouwkegel in de hekken gezet, de werklocatie wordt op termijn nog uitgebreid. Er komt een opslagterrein aan de overzijde Wegastraat waar begin juli ook het projectkantoor van de aannemer wordt neergezet. De afgelopen periode zijn afspraken met de gemeente gemaakt over de bereikbaarheid en is de uitvoering van de heikwerkzaamheden nader beschouwd.

Start heikwerkzaamheden

Op 26 juni start de aannemer met het aanvoeren van materiaal en materieel ten behoeve van de heikwerkzaamheden. Naast de aan- en afvoer van bouwmaterialen gaat het om de plaatsing van de heikinstallatie. In de loop van de week wordt dan gestart met de eerste paal. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Afhankelijk van de voortgang van het werk kan een uitbreiding van de werktijden plaatsvinden tot uiterlijk 19.00 uur.

De heikwerkzaamheden duren naar verwachting tot oktober. In week 30, 31 en 32 wordt niet geheid in verband met de bouwvak.

Geluid en trillingen

De heikwerkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder als het blok van de heikstelling de paal raakt. Het geluid wordt continue gemonitord en moet binnen het afgesproken geluidsniveau blijven, anders wordt het werk stilgelegd.




Er kunnen ook trillingen ontstaan tijdens de heikwerkzaamheden. Er wordt eerst een proef uitgevoerd om daadwerkelijke trillingen te meten. De eerste paal wordt geheid op de locatie waar de meest moeilijk doordringbare bodem aanwezig is. Dit geeft een goed beeld van de mate van trillingen. De mate van trillen wordt continue gemonitord en mag niet boven de richtlijnen volgens het Bouwbesluit 2012 uitkomen. Wanneer de meters uitwijzen dat de trillingen boven de richtlijnen uitkomen, dan wordt direct het werk stilgelegd. Er zijn 0-metingen gedaan voor de dichtbijgelegen bedrijven.

Bouwverkeer

In overleg met de gemeente Den Haag is de onderstaande aan- en afvoerroute van bouwmaterialen en overige materieel afgesproken. De route van het regulier transport loopt vanaf de A4 (Knooppunt Ypenburg), Rotterdamsebaan, Binckhorstlaan en Supernovaweg naar de projectlocatie. Vanaf de Supernovaweg komen er twee inritten naar de bouwlocatie. Vervolgens verlaat het afgaande transport via de Wegastraat, Regulusweg en Maanweg richting oprit A12 de bouwlocatie. Ter ondersteuning van een soepele afhandeling van het verkeer worden verkeersregelaars ingezet. Een kaartje ziet u op de achterzijde.



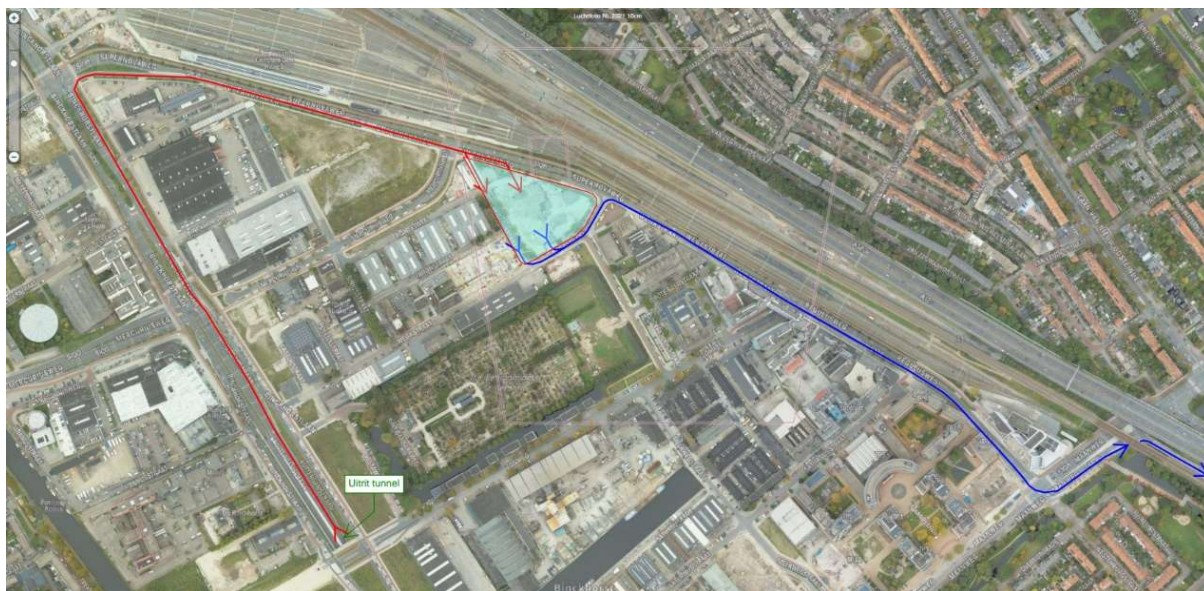

Aanmelden voor informatiebulletin

Met behulp van informatiebulletins wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten die u kunt verwachten op en rond de bouwplaats. Het eerste, en ook dit tweede informatiebulletin wordt huis aan huis verspreid aan de omliggende bewoners en bedrijven.

Als u dit informatiebulletin wilt blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven via onderstaand mailadres, onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. De volgende bulletins worden via e-mail verspreid.

Tenslotte

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u die:

- voor het bouwproces mailen naar EBDH@BAM.com
- voor specifieke vragen aan de politie of aanmelding voor het informatiebulletin naar huisvesting-eenheidsbureau.den-haag@politie.nl

Wat is de planning van het project?

Datum

Medio mei 2023 – juni 2023

Eind juni 2023 – oktober 2023

Medio juli 2023 – oktober 2023

Eind september

Oktober 2023 – juni 2024

Januari 2024 – oktober 2024

Juni 2024 – september 2025

Werkzaamheden

Inrichten bouwterrein

Heiwerkzaamheden

Betonwerkzaamheden
(fundering)

Start opbouw kranen

Ruwbouw

Dak

Afbouw

