


Infra Extern	26	33		
10.2.g				
1-1-2 platform				
Signcall Registration Service				
Berengroep (NAWP)				
6.Realiseren Managementinformatie				
Vastleggen informatie t.b.v. aanlevering Management	26	33		
7.Inrichten Beheer				
Inrichten Beheer externe partijen	21	33		
Inrichten Beheer MDC	21	33		
Inrichten Beheer DICT	21	33		
8.Opleveren 112APP met 112APP-keten in Productie				
9.Uitvoeren Pilot	41	44		
10.Eindoplevering	45	45		
<i>Ondersteunende activiteiten:</i>				
11.Communicatie Extern en Intern	21	38		
12.Opleiding medewerkers en beheerders	34	40		
13.Verkrijgen van plek op "Politie IV- en ICT-portfolio's"	09	12		

Resources (specificatie)

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Inzet in dagen	PM	PMO		
																																					18	10	1
																																					4	1	2
																																					0		
																																					0		
																																					0		
																																					7	1	1
																																					9	1	1
																																					16	1	1
																																					19	1	1
																																					13	1	1
																																					0		
																																					0		
																																					10	2	1
																																					10	2	1
																																					86	4	1
																																					56	4	1
																																					6	1	1
																																					0		
																																					0		
																																					10	2	1
																																					10	2	1
																																					86	4	1
																																					56	4	1
																																					6	1	1
																																					0		
																																					0		
																																					22	1	0
																																					17	1	0
																																					17	1	0
																																					17	1	0
																																					0		
																																					0		
																																					149	4	1
																																					0		
																																					0		
																																					0		
																																					0		
																																					149	4	1
																																					0		
																																					0		
																																					0		
																																					0		

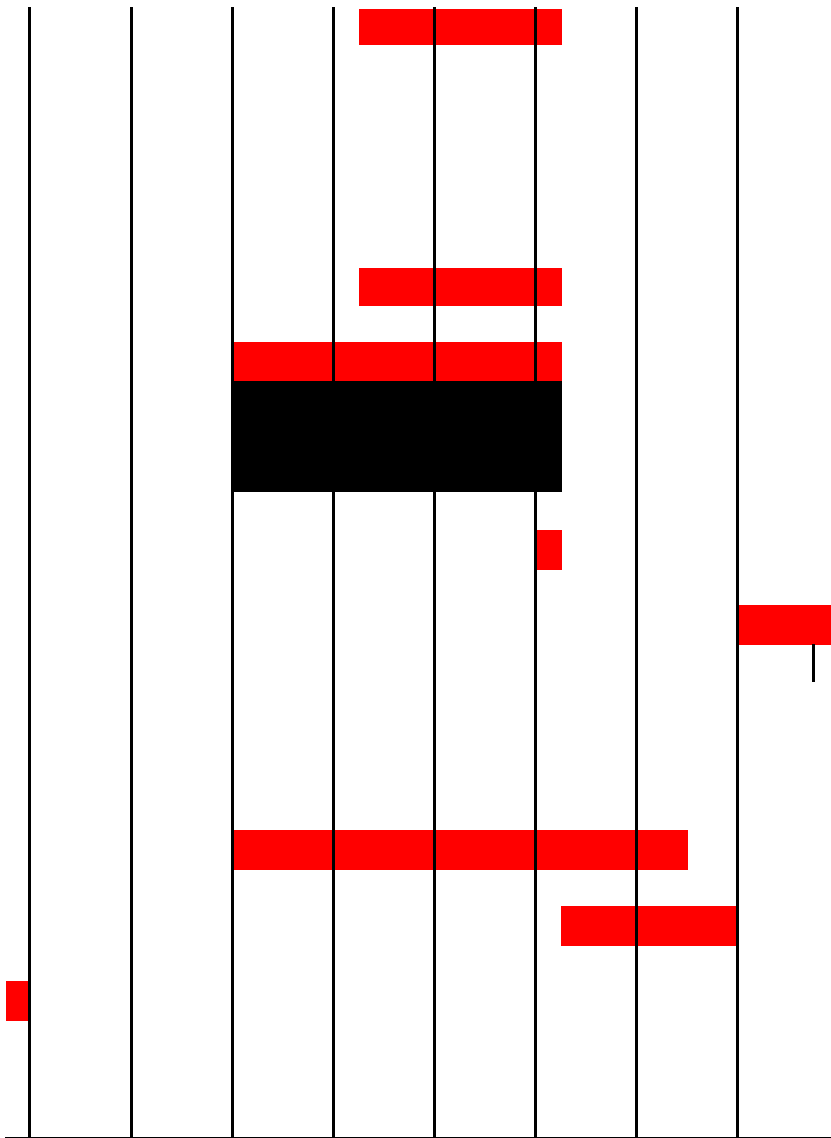

59	4	1
0		
0		
0		
0		
0		
9	1	
0		
0		
30	4	4
50	4	4
50	4	4
0		
0		
0		
38	4	8
0		
5	1	1
0		
0		
0		
20	2	2
0		
26	1	1
0		
2	1	

1082 dagen	80 dagen	45 dagen
8656 uren	640 uren	360 uren

106000

э)

Sr. User	Inf.Analyst	Architect.	Ontwerper	Jurist	APP-team	Test-team	Bouw-team-1	Bouw-team-2
----------	-------------	------------	-----------	--------	----------	-----------	-------------	-------------

2			5					
1								

2	3							
2	5							
2	5	2		5				
2	5	5	5					
2	3	3	3					

1	6							
1			6					
1					80			
1					20	30		
4								

1	6							
1			6					
1					80			
1					20	30		
4								

1		15	5					
1		10	5					
1		10	5					
1		10	5					

2		1	1			20	120	
---	--	---	---	--	--	----	-----	--

2		1	1			20		120
---	--	---	---	--	--	----	--	-----

2

1

1

20

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

1

1

4

4

1

7656
uren

zonder PM en PMO

811536

Bouw-team- 3	Beheer- team MMC	Beheer- team DICT	Beheer Coörd	Team Opleid.	Team Comm
-----------------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------

30

1

2			10
2	10	10	10
2	10	10	10

4	2	2	2
---	---	---	---

1

12

20
