

Digitaal Logboek Stalking

Overzicht gemaakte afspraken

200

Procesmatige afspraken:

- Oplevering uiterlijk eind Q2 2019
- Ontwikkeling vindt plaats bij het DevOps team in dienst van programma NMDD te Zeist
- Bij oplevering is de app getest en gereed om beschikbaar te worden gesteld in de App Stores
- Onderhoud van de app wordt verzorgd door het programma NMDD

Functionele eisen

Registratieveld algemene (verdachte)gegevens:

Onbekende verdachte;
Onbekende verdachte, geen signalement;
Bekende verdachte, uitvragen gegevens verdachte.

Registratieveld incident gegevens

Dag/ datum/ tijdstip incident;
Locatie incidente (handmatig of dmv locatievoorziening op telefoon)
Incidentbeschrijving
Getuigenverklaring
Uploaden digitale bewijsstukken:
Foto, video, document, geluidsfragment

Tijdljn

Geeft gebruiker inzicht in situatie

Overdrachtsfunctie

Als PDF naar ontvanger naar keuze. Indien mogelijk automatisch via infrastructuur politie


Op basis van gebruikersfeedback zijn aanpassingen mogelijk



Concept design tijdljn

Digitaal Logboek Stalking

Procesbeschrijving team App

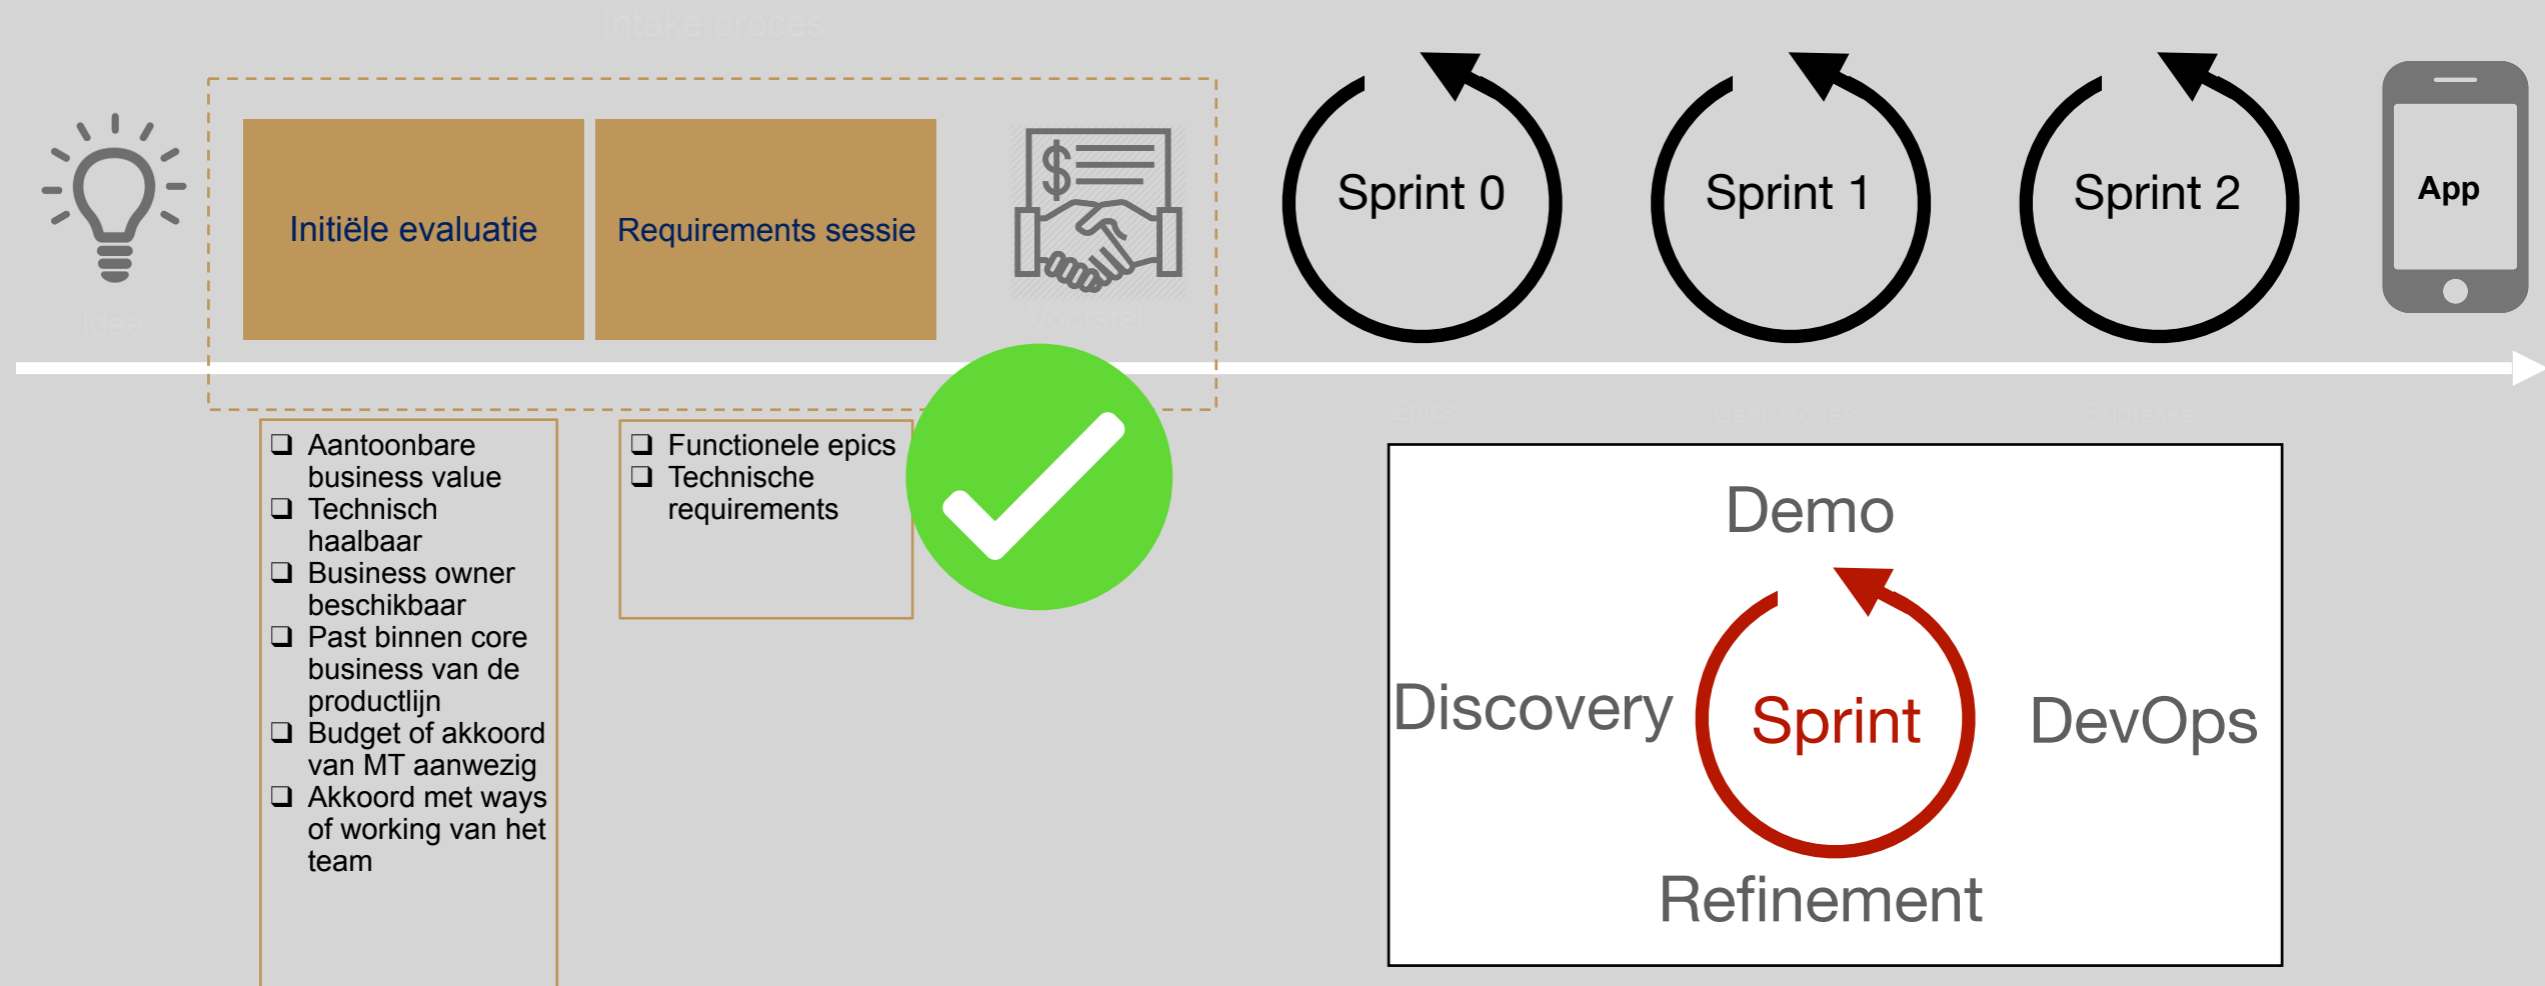

Discovery:	Ontwikkeling designs conform wensen business
Refinement:	Designs vertalen naar userstories Storypoints toekennen aan userstories Vaststellen te realiseren userstories voor komende sprint op basis van velocity*
DevOps:	Userstories ontwikkelen
Demo:	Demo van opgeleverde userstories Review op proces

*velocity = gemiddeld aantal gerealiseerde storypoints over de afgelopen sprints

Digitaal Logboek Stalking

Voorstel verantwoording ontwikkeling

Werkzaamheden sprint 0

Discovery

Designs 'digitaal logboek stalking' worden gemaakt.

Refinement

- Op basis van de designs worden de benodigd aantal storypoints voor de ontwikkeling bepaald

- Team App heeft een velocity van 65 storypoints per sprint

- Na de refinement is er zicht op het totaal aantal benodigde aantal storypoints en dus sprints

Vanuit J&V worden 2 sprints (130 storypoints) gesubsidieerd. De overige storypoints worden door NMDD bijgedragen

Verantwoording

Discovery

De concept designs worden ter informatie per e-mail aan subsidieverlener verstuurd.

Refinement

Na afronding discovery meeting 1:

- Doornemen designs
- Vaststellen of designs aan de gemaakte afspraken voldoen;
- Bespreken van benodigde aantal storypoints voor ontwikkeling
- Bespreken van het benodigde aantal storypoints in relatie tot de verleende subsidie

Werkzaamheden sprint 1-3

Voorafgaand aan elke sprint wordt vastgesteld welke storypoints opgepakt worden

Aan het eind van de sprint vindt een demo plaats. Hierbij wordt inzicht gegeven in de opgeleverde functionaliteiten

Tevens wordt er bij de demo gereflecteerd in welke mate het beoogde aantal storypoints is behaald

Mogelijkheid tot herijking van toekomstige te ontwikkelen stories


Verantwoording

Subsidieverlener wordt uitgenodigd voor demo's waarin aan het 'digitaal logboek stalking' gewerkt wordt.

Bij deze demo's wordt inzicht gegeven in:

- Voortgang van de ontwikkeling van het 'digitaal logboek stalking'
- Het aantal besteedde storypoints aan ontwikkeling 'digitaal logboek stalking'
- Inzicht in voortgangsrapportage + afdruk voortgangsrapportage per e-mail.

Medio februari

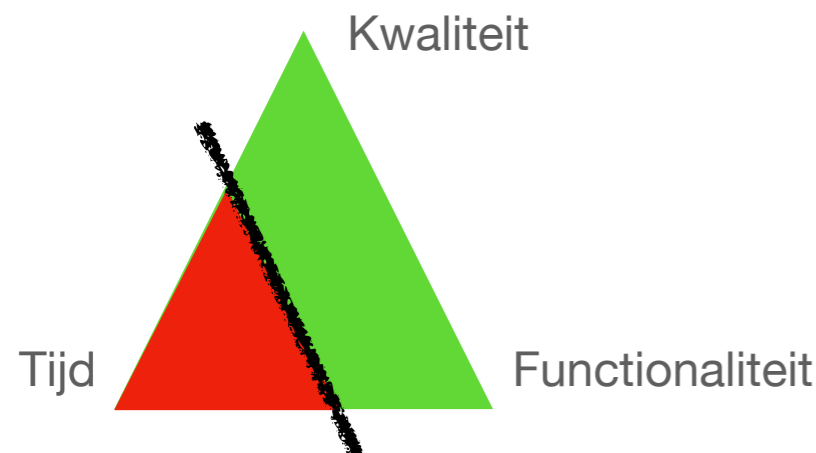

Agile/scrum stuurt op kwaliteit en functionaliteit, niet op tijd. Om deze reden is er geen tijdspad in steen gebeiteld.

Oplevering voor einde Q2 conform afspraak is realistisch.

Digitaal Logboek Stalking

Voorbeeld rapportage

Team App

SAMENVATTING SPRINT 7 (19 Maart 2018 - 2 april 2019)

In sprint 7 waren de belangrijkste doelstellingen:

- Ontwikkeling 'Digitaal Logboek Stalking'
- Algemene gegevens

Livegangen:

- Geen

Velocity:


• 65 punten gepland / ** opgeleverd.

• Toelichting:

- Analytics was als extra (nice to have) opgenomen voor Android, echter niet gehaald
- Automated UI testing is succesvol opgezet alleen niet alle testen werken

JIRA KEY	PLATFORM	OMSCHRIJVING	TYPE	NR.	
Politie					
14216	Android	Digitaal logboek stalking- banner	New	8	✓
14120 & 14230	IOS & Android	Digitaal logboek stalking- gegevens stalker	New	10	✓
14121 & 14223	IOS & Android	Digitaal logboek stalking- Sinds wanneer	New	16	✓
14238 & 14123	IOS & Android	Digitaal logboek stalking- Mijn gegevens	New	10	✓
14348 & 14289	IOS & Android	Digitaal logboek stalking- Tijdlijn	New	6	✓
13826	IOS	UI tests opsplitsen per feature	Enabler	3	✗
12108		API monitoring dashboard	Enabler	5	✓
12749		Gebruikersflows melden (analytics)	Enabler	2	✗
112					
14360	IOS	Automated UI testing opzetten	Enabler	5	✓

Nieuwe functionaliteiten, enablers en bugs

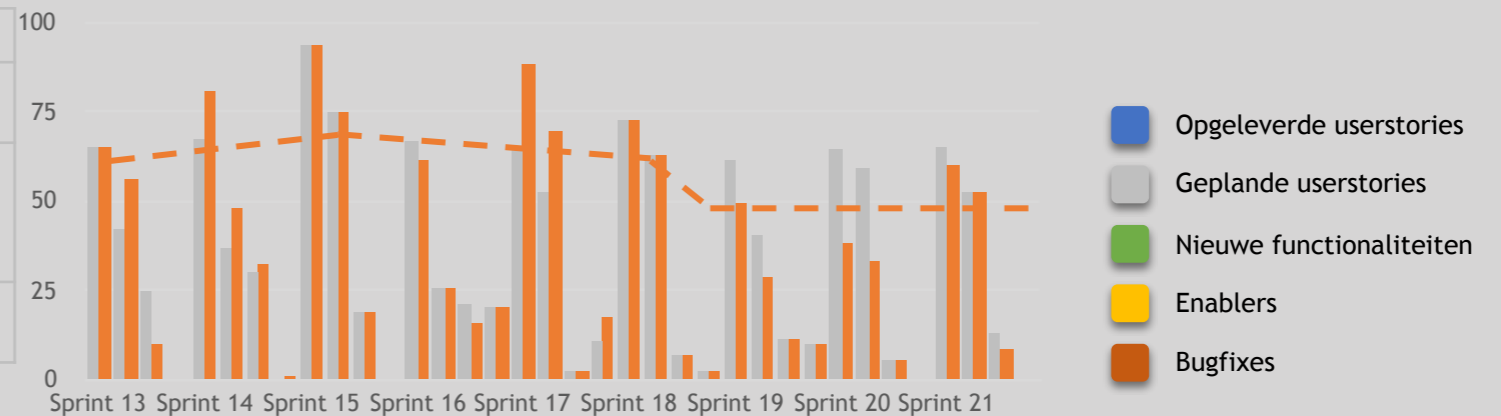

TOP 3 RISKS	POSSIBLE MITIGATION
Proeftuin #2 nog niet gereed	Mogelijk annuleren en alternatieve proeftuin opstarten.
Afwezigheid VPN Access op OSX beperkt de mogelijkheid van piket ondersteuning	Zonder VPN Access kan niet remote check-in plaatsvinden. KPN is hiermee bezig, alternatief bij issues binnen piket dient naar kantoor rijden.
Achterstand vanwege ziekte IOS developer	Geen

Voorstel

De concept designs worden ter informatie per e-mail verstuurd.

Na afronding discovery overlegmoment 1:

- Doornemen ontwerp;
- Vaststellen of ontwerp aan de gemaakte afspraken voldoet.

- Inschatting van benodigde storypoints voor ontwikkeling gereed
- Inzicht in het totaal aantal storypoints in relatie tot de verleende subsidie gereed

Voorstel

De concept designs worden ter informatie per e-mail verstuurd.

Eventuele verdere uitleg mogelijk indien gewenst.

